

# Minute Riunione MCC-DSM Design del 14 Giugno 2001

(Riunione settimanale di avanzamento progetto)

**Presenti:** Carlo, Giacomo (in collegamento telefonico), Nanni, Paolo Mo., Roberto.

## **1. Pianificazione temporale.**

Nel meeting dell'elettronica Kevin ha annunciato un ritardo di almeno 2 mesi nella sottomissione del FE-I. Abbiamo discusso 2 possibili alternative per la chiusura del disegno:

- Completamento entro fine luglio (prima della partenza per le vacanze estive);
- Completamento della simulazione entro fine luglio, layout finale LVS e DRC nella seconda metà d'agosto al rientro dalle ferie.

Si è deciso per la prima soluzione. Ciò implica terminare la simulazione entro il 3 luglio e quindi eseguire il layout e le verifiche nei successivi 15 giorni.

## **2. Annunci.**

Nanni e Roberto hanno fatto visita Kostas e hanno ricevuto l'assicurazione del completamento della SRAM in un paio di giorni. Kostas ci trasmetterà il data base completo del disegno includendo Schematics, Layout (con verifica DRC e LVS), Abstract e LEF. Roberto ha detto che a Bonn sarebbero interessati ad inserire nell'MCC alcune funzionalità aggiuntive come un blocco con il DORIC, la misura di temperatura, smart power. Si è deciso che il presente MCC verrà sottomesso nella configurazione attualmente definita, ma c'è interesse e disponibilità a una possibile futura versione che implementi alcune delle aggiunte in discussione.

## **3. Descrizione Behavioural e Strutturale dell'MCC.**

Roberto e Paolo Mo. trovano che una debolezza dell'Event Building è data dal controllo dei LV1 ricevuti dai FE che non risulta essere molto robusta. Infatti se un FE riceve un LV1 spurio, l'MCC non è in grado di accorgersi della situazione poiché il controllo di consistenza tra i vari FE è fatto sul L1ID e questo è in tale situazione lo stesso. Un controllo del BCID darebbe maggior garanzia sulla correttezza degli eventi. Roberto chiederà a Kevin se reputa possibile una modifica dei FE in modo che venga trasmesso il BCID invece del L1ID con i dati dei FE. Un'altra debolezza dell'Event Builder è legata ad un possibile FE che non invii eventi e quindi la ScoreBoard (la ScoreBoard è una tabella che tiene conto quanti eventi sono memorizzati in ciascuna ReceiverFIFO) si trova con una locazione vuota. In questo caso l'Event Builder si blocca aspettando i dati per quel FE. Identificare quale FE non mandi dati si può fare solo abilitando in successione un sottoinsieme di FE e provando ad acquisire eventi. Un metodo per semplificare il debugging sarebbe l'utilizzo di un registro in cui copiare '0' se la corrispondente locazione della Scoreboard è '= 0' o '1' se è '≠ 0'. In questo modo l'identificazione del FE difettoso è immediata leggendo il pattern di tale registro in caso di blocco nella trasmissione degli eventi da parte dell'MCC.

## **4. Simulazione e SimPix.**

Carlo e Paolo Mo. stanno continuando le simulazioni del chip, per ora sempre a livello behavioural. A questo stadio del disegno questa è la parte più pesante e dove si dovranno concentrare gli sforzi, in particolar modo nelle prossime 2 settimane.

## 5. Layout.

Giacomo non era riuscito a completare l'abstract della Delay line prima di partire da Genova (vi era ancora un errore su un pin di input). Lo completerà da Bonn la prossima settimana. Nanni ha generato la sintesi dell'albero del clock ottenendo un albero ad 8 livelli con 128 E\_Inv8 che pilotano i 1940 FF del core del chip. Il risultato sembra ragionevole e da uno skew di circa 200 ps (Worst Case Commerciale - WCOM).

Roberto utilizzerà tali parametri per una sintesi più precisa del chip completo. Nanni e Rusty hanno definito un nuovo layout (rispetto a quanto proposto a Febbraio 2001). Il nuovo pad layout, oltre ad essere più conveniente per il FlexHybrid 4.x, è anche più facilmente compatibile con un wire-bonding previsto per l'MCC-AMS (FlexHybrid 1, 2 e 3, package PLCC-84 e quindi MCCex, schede di test, setup per irraggiamento). Infine tale nuovo layout permette un MCC meno rettangolare e con migliore disposizione dei pin VDD/GND.

- MCC-DSM and MCC-AMS
- MCC-DSM only
- MCC-AMS only
- Test

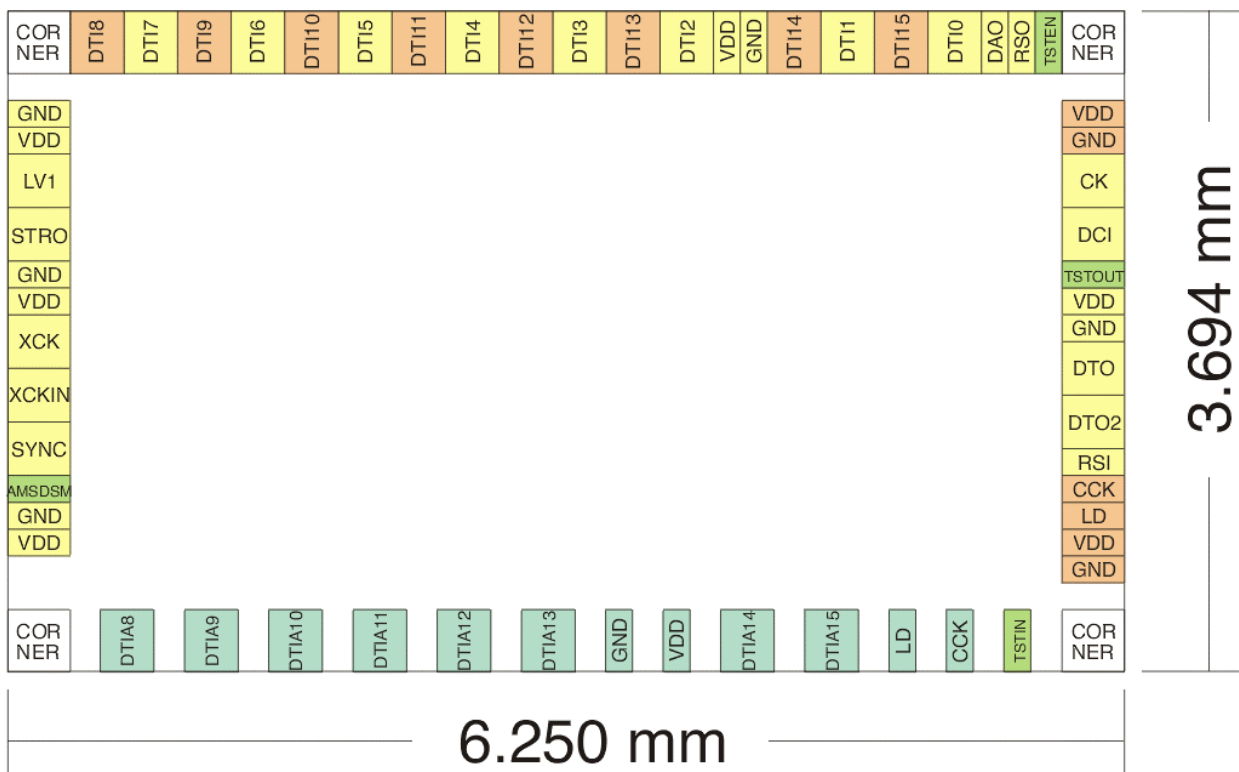


Figura 1: MCC-DSM pad layout

## 6. Action List.

La suddivisione delle attività per i prossimi giorni:

- Carlo: Generazione dei vettori di test per verificare il WriteReceiver mode, simulazione dell'MCC in forma di netlist;

- Giacomo: Abstract e LEF del circuito Delay;
- Nanni: Controllo dei LEF della Delay e della SRAM, organizzazione del floorplanning finale del chip con nuova disposizione dei pad di I/O;
- Paolo Mo.: Preparazione vettori di test e simulazione dell'MCC, package d'analisi di SimPix;
- Paolo Mu.: Correzione degli errori trovati (e che eventualmente verranno trovati) nella sua parte di disegno;
- Roberto: Ottimizzazione dei parametri di sintesi tenendo conto dell'albero del clock, sintesi completa dell'MCC e produzione netlist che includa anche la Delay.

*La prossima riunione si terrà Giovedì 21 Giugno alle ore 10*
